



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL - 2022

İçindekiler Tablosu

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	1
I. GENEL DEĞERLENDİRME.....	3
1.Kuruluşun Genel Finansman Kaynakları.....	3
2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi	4
3. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	5
4.Projelerin Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	5
II. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	6
1. Projelerin Genel Uygulama Durumu	6
2. Sektör Bazında Proje Uygulama Durumu	7
2.1. Eğitim - Yükseköğretim Sektörü	7
2.1.1. 2021H03-167996 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	7
2.1.2. 2021H03-168811 Derslik ve Merkezi Birimler.....	7
A. Merkez Kütüphane Binası	7
2.1.3. 2020H03-152017 Kampüs Altyapısı.....	9
2.1.4. 2020H03-152020 Büyük Onarım Projesi	10
2.1.5. 2021H03-167998 Muhtelif İşler	23
2.1.6. 2021H03-167997 Yayın Alımı.....	27
2.2. Eğitim - Kültür Sektörü	29
2.2.1. 2019H04-86515 Tarihi Su Sarnıcının Restorasyonu.....	29
2.3. DKH-Sosyal – Teknolojik Araştırma Sektörü.....	30
2.3.1. 2018K-17267 Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı.....	30

Tablo Listesi

Tablo 1: 2021 Yılı Yatırım Bütçesi (TL)	3
Tablo 2: Kapalı Fiziki Alanlar 1 (m ²)	4
Tablo 3: Kapalı Fiziki Alanlar 2 (m ²)	4
Tablo 4: 2021 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcama Bilgileri (TL)	6
Tablo 5: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleşen Alımlar	28

Grafik Listesi

Grafik 1: 2021 Yılı Yatırım Bütçesi Grafiği (TL)	3
Grafik 2: 2021 Yılı Toplam Yatırım Ödeneği ve Harcama (TL)	6

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Yıldız Teknik Üniversitesi, 100 yılı aşkın köklü geçmişi, güçlü akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası alanda lider bir araştırma üniversitesi olma vizyonu ile kurulduğu günden bu yana araştırma ve geliştirme, eğitim ve öğretim, toplumsal katkı gibi üniversitelerin temel fayda alanlarında ülkemizin en nitelikli, seçkin ve köklü kurumları arasında yer almaktadır.

Türkiye'nin en büyük kamu üniversitelerinden biri olarak akademik gücümüzün odak noktası, hizmet ettiğimiz toplumun karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek ve karşısına çıkan fırsatları değerlendirmektir. Küresel gelişmeler hangi doğrultuda olursa olsun Üniversitemiz, öğrencileri, akademik ve idari personeli, mezunları ve profesyonel iş dünyasının da katılımıyla, güçlü yanlarını kullanıp iyileştirmeye açık yönlerini geliştirerek "uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma mükemmelliğine ulaşarak toplumun ihtiyaçlarına ve ulusal rekabet gücüne katkıda bulunan bireyler yetiştirme" misyonu ile hareket edecektir. Üniversitemiz bu misyon için akademik mükemmeliyet ve yenilikçilik temel değerlerinden ödün vermeyecektir. İlke edindiğimiz amaçları gerçekleştirebilmek için yürüttüğümüz faaliyetleri, önümüzdeki dönemlerde de geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz.

Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım Programında toplam 10 adet yatırım projesi mevcut olup, bu projeler için 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 49.038.000 TL

hazine yardımı ve 1.660.000 TL öz gelir olmak üzere toplam 50.698.000 TL ödenek öngörülmüş olup, yıl içinde hazine artığından 10.000.000 TL, yedek ödenekten 3.500.000 TL olmak üzere toplam 13.500.000 TL ödenek eklenmiş olup yılsonu toplam ödeneği 64.198.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde 60.895.194 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı içinde yapılan yatırım harcamalarıyla alt yapının güçlendirilmesi amaçlanmış olup önümüzdeki yıllarda ise yeni hizmet alanları hizmete sunmak ve mevcut yapıların modernize edilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede sürdürülebilirliğin kalıcı hale getirilmesi planlanmaktadır. Tüm harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içerisinde yer almaktadır.

Bütçe imkanları dahilinde 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırım projelerine ilişkin ayrıntıların yer aldığı "Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu"nu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Tamer YILMAZ

Rektör

I. GENEL DEĞERLENDİRME


1. Kuruluşun Genel Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "**Özel Bütçeli**" bir kurumdur.

Tablo 1: 2021 Yılı Yatırım Bütçesi (TL)

YIL	HAZİNE YARDIMI	ÖZ GELİR	TOPLAM
2021	49.038.000,00	1.660.000,00	50.698.000,00

Grafik 1: 2021 Yılı Yatırım Bütçesi Grafiği (TL)

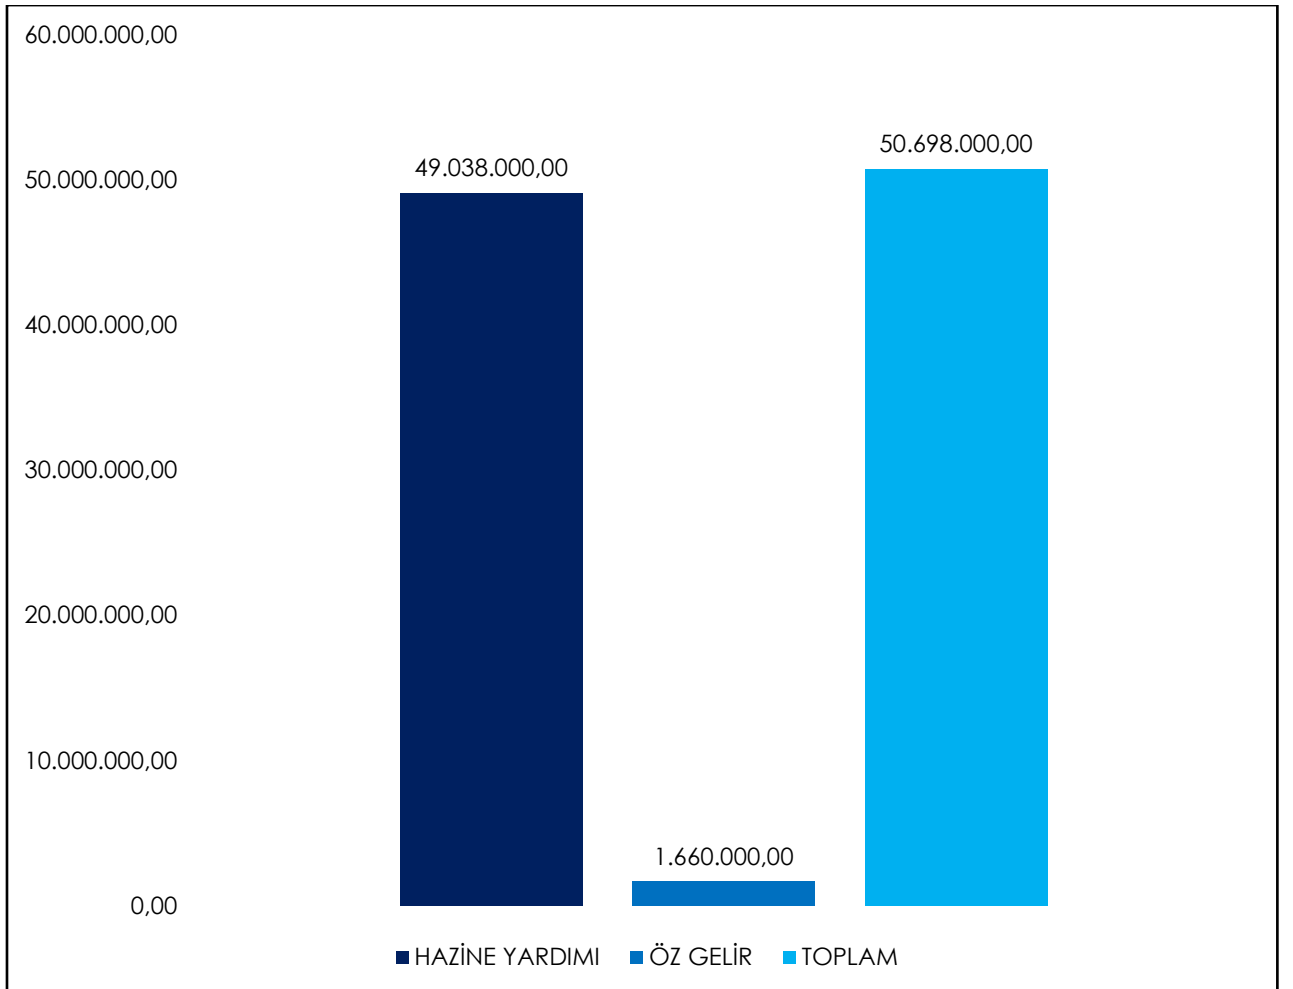

2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemiz Davutpaşa (Esenler), Yıldız (Beşiktaş), Maslak ve Acıbadem yerleşkelerine sahiptir. Üniversitemizde 11 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu ve 1 yüksekokul bulunmaktadır.

- **Toplam Açık Alan** : 1.420.578,60 m²
- **Toplam Kapalı Alan** : 401.296,00 m²

Tablo 2: Kapalı Fiziki Alanlar 1 (m²)

2021 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M ²)					
Birimler	İdari Bina Alanları	Eğitim Alanları		Spor Alanları	
		Derslik	Laboratuvar	Açık	Kapalı
Rektörlük	25.285	23.160	8.751	15.725	6.935
Fakülteler	62.011	80.558	56.938	0	0
Yüksekokullar	4.814	9.303	293	0	0
Enstitüler	1.333	0	0	0	0
Kütüphane	13.138	0	0	0	0
Sosyal Tesisler	22.612	0	0	0	0
Depo	5.851	0	0	0	0
TOPLAM-1	135.044	113.021	65.982	15.725	6.935

Tablo 3: Kapalı Fiziki Alanlar 2 (m²)

2021 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M ²)				
Birimler	Sosyal Alanlar			
	Yemekhane	Lojmanlar + Misafirhane	Yurtlar	Diğer
Rektörlük	5.436	48.933	2.306	7.914
TOPLAM-2	5.436	48.933	2.306	7.914
GENEL TOPLAM (TOPLAM 1 + TOPLAM 2)	401.296,00			

NOT 1: Sosyal Tesisler Diğerleri Bölümünde Toplantı /Konferans Salonları, Kulüp/Dernekler, Eğitim /Dinlenme Tesisleri, Kantin/Kafeterya, Kreşler yer almaktadır.

NOT 2: Tabloda yer alan veriler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan temin edilmiş olup **T.C. Cumhurbaşkanlığı Mek-Sis'te** yer alan verilerdir.

3. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2021 yılında kapasite artışı olmamıştır.

4.Projelerin Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca AHP ve AFP'lerin idarenin tekliflerinin dışına çıkılarak düzenlenmesi, ödenek serbest bırakmalar, bütçe ödeneklerinin öğrenci ve personel başına olacak şekilde gerçek ihtiyaca göre belirlenmemesi, ihale süreçlerinin uzunluğu, mevzuatın çok sık değişmesi vb. durumlardır.

Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olmasından dolayı yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi nedeniyle talepler yeterince karşılanamamaktadır.


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

II. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Projelerin Genel Uygulama Durumu

Üniversitemiz, 2021 Yılı Yatırım Kesintili Başlangıç Ödeneği (KBÖ) **50.698.000 TL** olup yılsonu toplam yatırım ödeneğimiz **64.198.000 TL** olarak gerçekleşmiştir. **60.895.194 TL** harcama yapılarak nakdi gerçekleşme **%95** seviyesinde gerçekleşmiştir.

Grafik 2: 2021 Yılı Toplam Yatırım Ödeneği ve Harcama (TL)

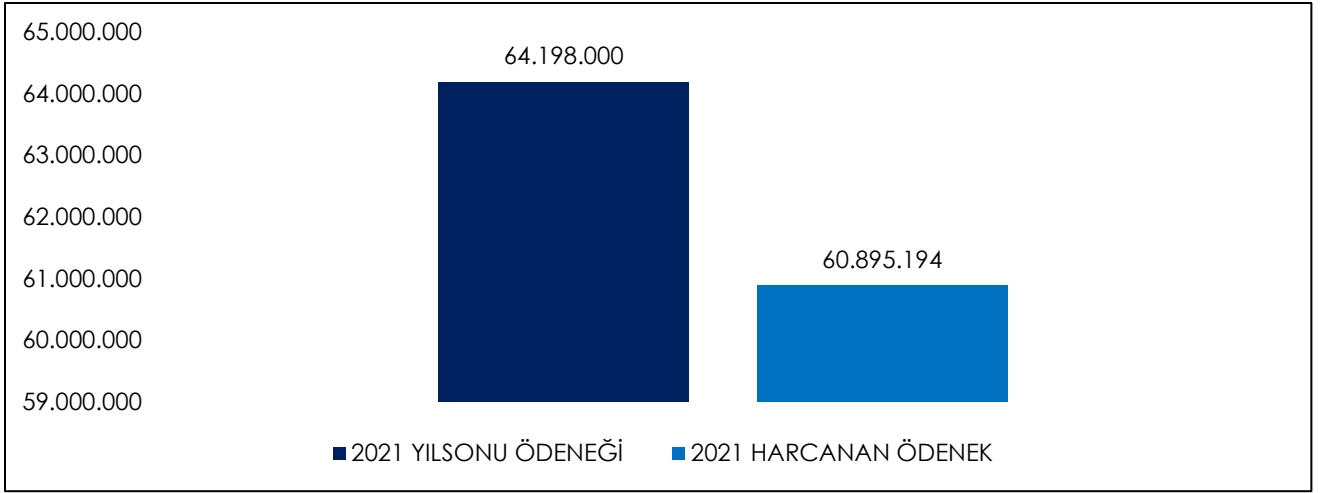

Tablo 4: 2021 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcama Bilgileri (TL)

SIRA NO	YATIRIM PROJESİNİN ADI	YATIRIM ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEĞİ	HARCANAN ÖDENEK
A	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ	35.898.000	50.487.000	47.184.676
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	441.000	440.946
2	Merkez Kütüphanesi Binası	16.000.000	14.988.000	14.987.955
3	Kampüs Altyapısı	3.000.000	2.778.000	2.777.425
4	Büyük Onarım	5.498.000	13.660.000	10.407.431
5	Muhtelif İşler	7.200.000	15.620.000	15.610.089
6	Yayın Alımları	4.000.000	3.000.000	2.960.831
B	KÜLTÜR SEKTÖRÜ	3.800.000	2.711.000	2.710.517
7	Tarihi Su Sarnıcının Restorasyonu	800.000	441.548	441.547
8	Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu	500.000	2.269.452	2.268.970
9	Tarihi Sancak Köşkü Restorasyonu	2.500.000	0	0
C	TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ	11.000.000	11.000.000	11.000.000
10	Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı Projesi	11.000.000	11.000.000	11.000.000*
GENEL TOPLAM		50.698.000	64.198.000	60.895.194

*: Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı Projesine 2021 yılı başlangıç ödeneği olarak 11.000.000 TL tahsis edilmiş ve bu miktar özel hesaba aktarılmış ancak özel hesaba aktarılan tutardan harcama yapılmamıştır.

2. Sektör Bazında Proje Uygulama Durumu

2.1. Eğitim - Yükseköğretim Sektörü

Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Programında, Eğitim-Yükseköğretim sektöründe toplam **6 adet yatırım projesi** yer almaktadır. Bu projelere toplam **35.898.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Sektörün yılsonu revize ödeneği **50.487.000 TL** olarak gerçekleşmiş ve toplam **47.184.676 TL** harcama yapılmıştır.

2.1.1. 2021H03-167996 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projeye başlangıç ödeneği olarak **200.000 TL** tahsis edilmiş ve revize ödenek **441.000 TL**, harcama ise **440.946** olarak gerçekleşmiştir.

- **Sorumlu Birim:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
 1. Yıldız Kampüsü A blok Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşİ,
 2. 3mw Güneş Paneli Sistemi Proje ve Lisans Takiplerinin Yapılması İşİ,
 3. Davutpaşa Kampüsü Kütüphane Binası A Blok Statik Projelerinin Revize Proje Yapılması,
 4. Bina Enerji Etüdüleri ve Bina Enerji Kimlik Belgeleri Alınması İşİ,
 5. Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası (14 Nolu Bina) Restorasyonu Mimari Mesleki Kontrollük Hizmet Alım İşİ,
 6. Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam İç Mekân Tasarımı ve Menza Önü Cephe-Yol ve Çevre Düzenlemesi Proje Yapım İşİ.


2.1.2. 2021H03-168811 Derslik ve Merkezi Birimler

A. Merkez Kütüphane Binası

Projeye başlangıç ödeneği olarak **16.000.000 TL** tahsis edilmiş ve revizyon sonrası **14.988.000 TL** ödenek, harcama ise **14.987.955 TL** olarak gerçekleşmiştir.

- **Sorumlu Birim:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri:**
 - **Adı:** YTÜ Davutpaşa Kampüsü Yeni Kütüphane Binası
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık İhale

- **Projede Geline Aşama:** Yıllara sari iş olarak yapılması planlanmış olup % 30 olarak bitmiş ve 2023 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.
- **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
Mevcut kütüphanenin yetersizliği nedeniyle 2021 yılı içerisinde başlatılan Yeni kütüphanenin Üniversitemiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2 Bodrum + Zemin + 1 Normal kat olarak inşa edilmesi ve 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

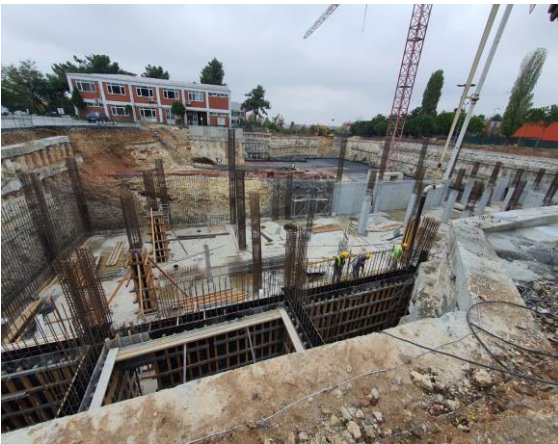

2.1.3. 2020H03-152017 Kampüs Altyapısı

Projeye başlangıç ödeneği olarak **3.000.000 TL** tahsis edilmiş ve revize ödenek **2.778.000 TL** olarak gerçekleşmiş ve bu ödenekten **2.777.425 TL** harcama yapılmıştır.

- **Sorumlu Birim:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Tenis Kortları, Basketbol Sahası Ve Sporcu Soyunma Odaları Yapım İşİ
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı kamu ihale kanunu
 - **Usulü:** Açık İhale
 - **Projede Geline Aşama:** İş zamanında başlatılmış ve verilen süre içerisinde bitirilip teslim edilmiştir.
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı Bilgisi:** % 100
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
 1. 2 Adet Tenis Kortu
 2. 1 Adet Basketbol Sahası
 3. Halı Saha Zemin Yenileme & Tel Çit Yenileme ve Değişimi



2.1.4. 2020H03-152020 Büyük Onarım Projesi


Projeye başlangıç ödeneği olarak **5.498.000 TL** tahsis edilmiş ve revize ödenek **13.660.000 TL**, harcama ise **10.407.431 TL** olarak gerçekleşmiştir.

- **Sorumlu Birim:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** YTÜ Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binalarında Teras Çatı Yalıtım ve Dış Cephe Boya Yapılması İş
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık ihale
 - **Projede Geline Aşama:** İş zamanında başlatılmış ve verilen süre içerisinde bitirilip teslim edilmiştir.
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı Bilgisi Veri Girişi İçin:** %100
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
 1. YTÜ Davutpaşa Kampüsünde bulunan Eğitim Fakültesi,
 2. Merkez Laboratuvarı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 3. Kapalı Spor Salonu Teras Yalıtım İş Yapılması,
 4. Yabancı Diller Fakülte Binalarının Cephe Boya,
 5. Kapalı Spor Salonu Dış Cephe Boya Yapılarak iş tamamlanmıştır.





- **Sorumlu Birim:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** YTÜ Davutpaşa Kampüsü Yemekhane Binası Bodrum Kat Tadilatı ve Onarımı İşİ
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık İhale
 - **Projede Geline Aşama:** İş Zamanında Başlatılmış ve Verilen Süre İçerisinde Bitirilip Teslim Edilmiştir.
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı:** %100
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
 1. Yemekhane binası bodrum katında bulunan öğrenci kulüpleri kaldırılarak yerine 208 kişilik öğrenci yemekhanesi yapılmıştır.
 2. Bodrum katta Mevcutta bulunan bölme duvarları yıkılarak Asma tavan, yer döşeme kaplaması, elektrik tesisatı ve yangın algılama sistemleri yenilenmiş olup iş tamamlanmıştır.
 3. Öğrenci kulüpleri ise Kapalı yüzme havuzu yanındaki kulüpler vadisine taşınmıştır.

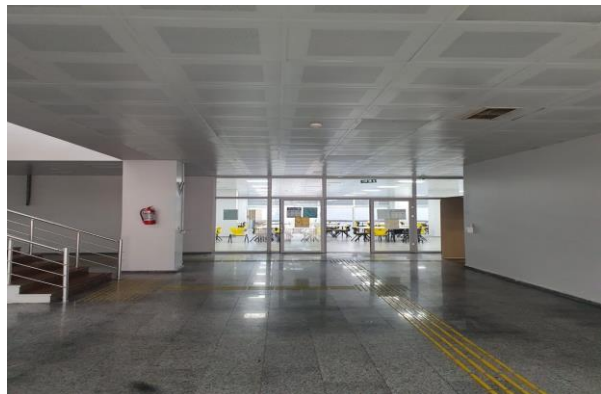




- **Sorumlu Birim:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** YTÜ Beşiktaş Kampüsü D ve B Blok Yangın Algılama Tesisatı Yapılması ile YTÜ Genelindeki Yangın Sistemlerinin Bakımlarının Yapılması İşİ,
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık ihale
 - **Projede Geline Aşama:** İş Zamanında Başlatılmış ve Verilen Süre İçerisinde Bitirilip Teslim Edilmiştir.
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı:** %100
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
 1. Yangın algılama sistemlerinin bakımı ve onarımı,
 2. Yangın pompaları, yangın dolapları, hidrantları ve gazlı söndürme sistemlerinin bakımı ve tadilatı,
 3. B Blok ve D Blok'a yangın algılama sistemleri yapılması işleri yapılmış olup iş tamamlanmıştır.



- **Sorumlu Birim:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** YTÜ Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi Çevre Yolları Yapımı ve Boyama İşİ
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık ihale
 - **Projede Geline Aşama:** İş zamanında başlatılmış ve verilen süre içerisinde bitirilip teslim edilmiştir.
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı:** %100
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
 1. Fakülte binasındaki bloklar arası çevre düzenlemesi
 2. Bodrum kat su alan kısımların yalıtım yapılması
 3. Bloklarda çatının asansör kovası üstlerine gelen yerlerin yalıtım yapılması DD1-EE1 zemin kat ızgaraların izolasyonu yapılmış ve sorun giderilmiş ve zemin kat boyası yapılarak iş tamamlanmıştır.

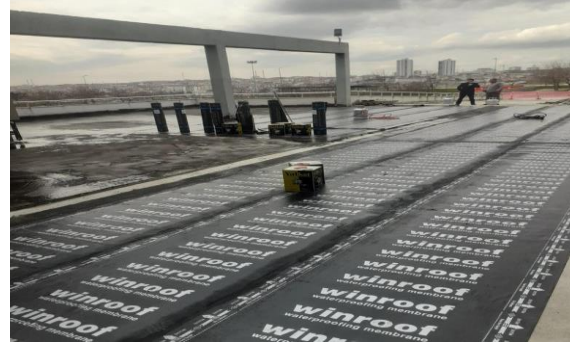






- **Sorumlu Birim:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** YTÜ Davutpaşa Kampüsü Lojmanları Sıhhi Tesisat Boruları Değişimi
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık İhale
 - **Projede Geline Aşama:** İş zamanında başlatılmış ve verilen süre içerisinde bitirilip teslim edilmiştir.
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı:** %100
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
 1. YTÜ Davutpaşa kampüsünde bulunan 11 bloktan oluşan lojmanların sıcak su sıhhi tesisat boruları değişimi,
 2. Soğuk su vanalarının ve borularının değişimi,
 3. Yangın algılama sistemlerinin bakımı,
 4. Yangın jeneratörlerinin tadilatı,
 5. Yangın boruları yenileme,
 6. Yangın dolapları takılması ve yangın sistemleri bakımlarının yapılması işleri yapılmış olup iş tamamlanmıştır.





- **Sorumlu Birim:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** YTÜ Fakülteler Engelli Yolu Yapım İşi
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık ihale
 - **Projede Geline Aşama:** İş zamanında başlatılmış ve verilen süre içerisinde bitirilip teslim edilmiştir.
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı:** %100
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**


Yıldız Kampüsü Gemi İnşaat Fakültesi, Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi engelli yolları ve kılavuz yolları yapılmıştır.

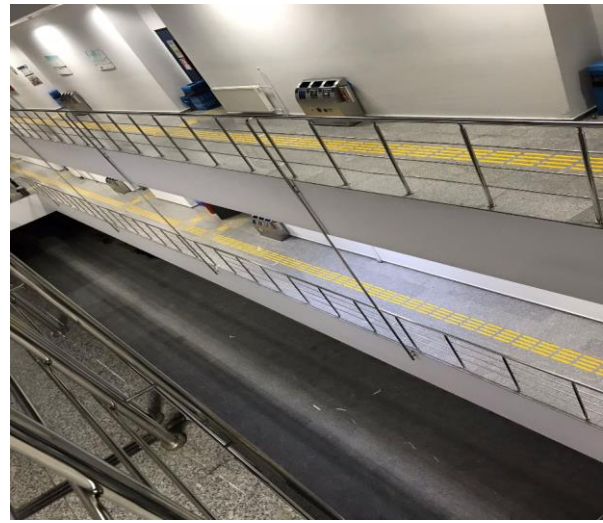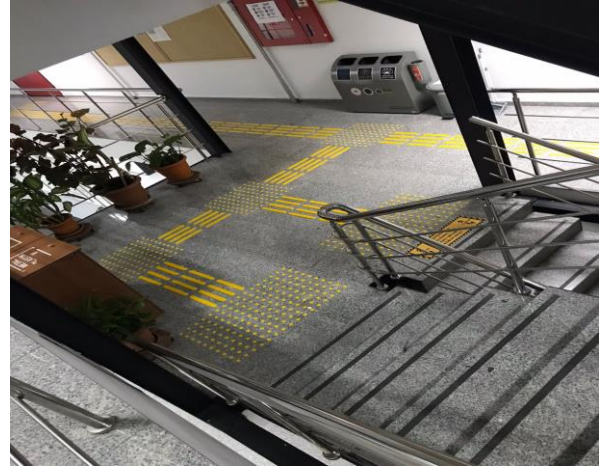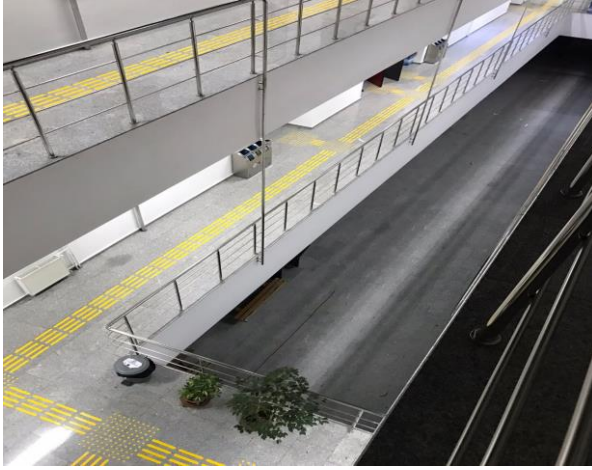

- **Sorumlu Birim:** Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Kız Yurdu Balkon Zemin Tadilatı
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Doğrudan Temin
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlanmış ve teslim edilmiştir.
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
 - A. Kız yurdu açık balkon tadilat işi ve inşaatı.**
 1. Zemin sökülmesi ve kırılması.
 2. Duvarlardaki cephe kaplamalarının sökülüp yeniden montajı,
 3. Zeminin yalıtımdan sonra yeniden yanık granit ile kaplanması,
 4. Yalıtım bütünlüğü sağlanması.



- **Sorumlu Birim:** Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Kız Yurdu Yangın Yönetmeliği Kapsamında Tadilatlar.
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Doğrudan Temin
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlanmış ve teslim edilmiştir.
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
 1. 1.ve 2.Kat kısımlarında yangın koridoru oluşturulması.
 2. Koridorlar için yangın kapıları alınması.
 3. 8 adet selenoid vana montajı.
 4. Kazan dairesindeki büyük elektrik panosu ile giriş kat 1.kat ve 2. katlarındaki elektrik panoları pano içi gazlı söndürme sistemi yapılması.
 5. Duvar kırımı ve menfez yapımı.

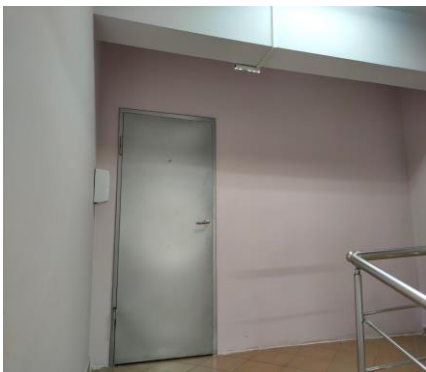

- **Sorumlu Birim:** Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Yaya Yolu ve Drenaj İşİ
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Doğrudan Temin
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlanmış ve teslim edilmiştir.
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
 1. Bina dışındaki baskılı beton kırılıp dışarı atıldı.
 2. Kırım sonrası zemin temizlenip çesan demir ile örüldü ve zemin baskılı beton ile kapatıldı.
 3. Silimi yapılan beton üzerine poliüretan malzeme ile kaplandı.
 4. Eksik olan tuğlalar tamamlandı.
- **Sorumlu Birim:** Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Kız Yurdu Çatı Tamiri
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Doğrudan Temin
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlanmış ve teslim edilmiştir.
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
 1. Mevcut kenet sistem çatı örtüsü tamamen söküldü.
 2. Gizli dere-oluk içlerinde bulunan yalıtım membranları sökülerek oluk içleri ve iniş boruları temizlendi.
 3. Oluk içleri alüminyum membran ile kaplandı
 4. Tüm çatı yeniden alüminyum trapez çatı örtüsü altına gelecek şekilde en az 10 cm kıvrılarak yapıldı.
 5. Baca şapkaları sökülerek üstü kapalı menfez haline getirildi.




- **Sorumlu Birim:** Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

- **İhale Bilgileri**

- **Adı:** Vana Değişimi
- **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- **Usulü:** Doğrudan Temin
- **Projede Geline Aşama:** Tamamlanmış ve teslim edilmiştir.
- **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**

Boyner tankı üzerinde bulunan 8 adet paslanmış küresel vananın değişimi sağlanmıştır.

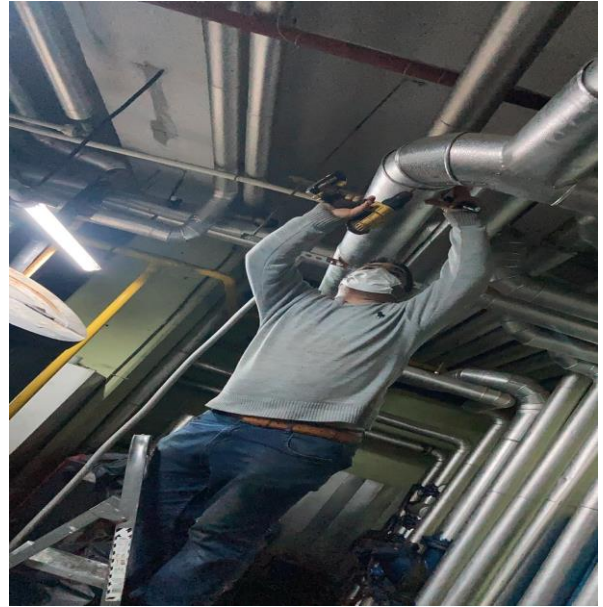

- Sorumlu Birim: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- Proje Kapsamında Yapılan İşler:

1	FEN EDEBİYAT VE İNŞAAT FAK. CHİLLER CİHAZLARI BAKIM SÖZLEŞMESİ	36.970,00	6.654,60	43.624,60
2	JENERATÖR BAKIM SZLEŞMESİ 1. Taksit	10.000,00	1.800,00	11.800,00
3	JENERATÖR BAKIM SZLEŞMESİ 2. Taksit	10.000,00	1.800,00	11.800,00
4	ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ (5 ADAET BEŞİKTAŞ4 ADET ,İKTİSAT ,2 Adet Kütüphane)	1.870,00	336,60	2.206,60
5	ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ (5 ADAET BEŞİKTAŞ4 ADET ,İKTİSAT ,2 Adet Kütüphane)	1.870,00	336,60	2.206,60
6	ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ (5 ADAET BEŞİKTAŞ4 ADET ,İKTİSAT ,2 Adet Kütüphane)	1.020,00	183,60	1.203,60
7	SANAT TAS.FAK.-ELEKTRİK ELEKTRONİK FAK.-FEN-EDEBİYAT FAK. ISTMA SOĞ.SİST.BAK.	59.322,03	10.677,97	70.000,00
8	YABANCI DİLLER Y.O.MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ARMATÜR V.S	33.700,00	6.066,00	39.766,00
9	GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜNE CAM KESİMİ VE SÜRGÜLÜ PENCERE YAPIMI	2.350,00	423,00	2.773,00
10	GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜNE HIZ KESİCİ KASIS YAPIMI	10.000,00	1.800,00	11.800,00
11	GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜNE şeritli led aydınlatma,zaman rölesi ve adaptör uygulama YAPIMI	13.000,00	2.340,00	15.340,00
12	REKTÖRLÜK TAŞ BİNA KUŞLARIN GELMEMESİ İÇİN TEL ÇİT YAPILMASI	65.000,00	11.700,00	76.700,00
13	HALKALI MENEKŞE SİTESİ C2-6 BLOK d.52 BANYO FAYANSLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ	15.500,00	2.790,00	18.290,00
14	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KOMPANZASYON SİSTEMLERİ 2020 yılı	29.000,00	5.220,00	34.220,00
15	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KOMPANZASYON SİSTEMLERİ 2021 yılı	28.400,00	5.112,00	33.512,00
16	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KOMPANZASYON SİSTEMLERİ 2021 yılı	28.400,00	5.112,00	33.512,00
17	YABANCI DİLLERE GÜVENLİK MASALARINA KORUMA PANELİ YAPIMI	13.750,00	2.475,00	16.225,00
18	KONGRE MERKEZİNE SAHNE İÇİN ENGELLİ ASANSÖRÜ (2 ADET)	79.500,00	0,00	79.500,00
19	KİMYA METALÜRJİ FAK. EK BİNA KEPENK TAMİRİ	4.400,00	792,00	5.192,00
20	FEN EDEBİYAT FAK. A VE B BLOĞU BESLEYEN YANGIN HİDROFOR ONARIMI	12.770,00	2.298,60	15.068,60
21	chiller bakım sözleşmesi	38.400,00	6.912,00	45.312,00
22	KONGRE MERKEZİ VE KÜTÜPHANE KLİMA SANTRALLERİ BAKIM SÖZLEŞMESİ 1. TAKSİT	11.875,00	2.137,50	14.012,50
23	KONGRE MERKEZİ VE KÜTÜPHANE KLİMA SANTRALLERİ BAKIM SÖZLEŞMESİ 3. TAKSİT	11.875,00	2.137,50	14.012,50
24	İKTİSAT FAK. SU DEPOSUNA BAĞLI HİDROFOR POMPALARI TAMİRİ İŞİ	11.425,00	2.056,50	13.481,50
25	YABANCI DİLLER Y.O.MÜDÜRLÜĞÜ CAMLI KAPI VE ÇERÇEVELERİ	12.834,00	2.310,12	15.144,12
26	A BLOK DEPREM DAYANIKLILIK ANALİZİNİN YAPILMASI İŞİ	70.000,00	12.600,00	82.600,00
27	İNŞAAT FAKÜLTESİ,İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ,BİLİM VE TEK. UY.AR.MER.soğutma grupları bakımı (Sözleşme)	38.750,00	6.975,00	45.725,00
28	İNŞAAT FAKÜLTESİ,İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ,BİLİM VE TEK. UY.AR.MER.soğutma grupları bakımı (Sözleşme)	38.750,00	6.975,00	45.725,00
29	KİMYA MET.FAK. 3 ADET HİDROFOR POMPA TAMİRİ	4.800,00	864,00	5.664,00
30	ELEKTRİK ELEKTRONİK FAK. ISITMA HATTINA AİT BORU VE KOSVA VANALARIN DEĞİŞİMİ	120.033,70	21.606,07	141.639,77
31	KİMYA METALÜRJİ FAK.TEMİZ SU HATTI DEĞİŞİMİ	4.500,00	810,00	5.310,00
32	ELEKTRİK ELEKTRONİK FAK.KAPI,CEPHE TADİLATI,TABELA YAPIMI	101.500,00	18.270,00	119.770,00
33	DOĞALGAZ KAZANLARI BAKIM SÖZLEŞMESİ 2021-2022-1.TAKSİT	12.500,00	2.250,00	14.750,00
34	ELEKTRİK ELEKTRONİK-FEN EDEBİYAT-EĞİTİM FAK. 14 ADET ASANSÖR BAK SÖZLEŞMESİ	5.600,00	1.008,00	6.608,00
35	DAVUTPAŞA KAZAN DAİRELERİNE DOLUM VANASI TAKILMASI İŞİ	13.000,01	2.340,00	15.340,01
36	elektrik elektronik fak. Karşılama bankosu	9.600,00	1.728,00	11.328,00
37	KİMYA METALÜRJİ FAK.LABORATUVAR TEZGAHI VE DOLAP YAPILMASI İŞİ	52.450,00	9.441,00	61.891,00
38	YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KORKULUKLARINA DİKME YAPILMASI	81.900,00	14.742,00	96.642,00
39	DAVUTPAŞA VE YILDIZ KULLANIM SUYU HİDROFORLARI PERİYODİK BAK.SÖZ. SON TAKSİT	6.000,00	1.080,00	7.080,00
40	DAVUTPAŞA C2 VE J3 BLOKLARIN ÇATI YALITIMI İŞİ	119.037,50	21.426,75	140.464,25
41	ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ (5 ADAET BEŞİKTAŞ4 ADET ,İKTİSAT ,2 Adet Kütüphane)	1.870,00	336,60	2.206,60
42	ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ (5 ADAET BEŞİKTAŞ4 ADET ,İKTİSAT ,2 Adet Kütüphane)	2.515,00	452,70	2.967,70
43	yabancı diller yüksekokulu engelsiz üniversite başvurusu için eksiklilerin yapımı	102.990,00	18.538,20	121.528,20
44	yabancı diller yüksekokulu engelsiz üniversite iç mekan trabzanları yapımı	117.400,02	21.132,00	138.532,02
45	Fen Edebiyat Fakültesi engelsiz üniversite başvurusu için yönlendirme tabelaları yapımı	86.750,00	15.615,00	102.365,00
46	KÜTÜPHANE İNŞAAT SAHASINDA BULUNAN KAMERA DOLABININ SAHA DIŞINA TAŞINMASI İŞİ	5.932,00	1.067,76	6.999,76
47	Fen Edebiyat Fakültesi engelsiz üniversite başvurusu için eksiklilerin yapımı ve küpeste yapımı	72.000,00	12.960,00	84.960,00
48	FEN EDEBİYAT FAK.ŞEBEKE SUYU BORU DEĞİŞİMİ	11.800,00	2.124,00	13.924,00
49	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI (11 ADET ASANSÖRÜN MAVİ ETİKET ALMASI)	30.700,00	5.526,00	36.226,00
50	BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ (YAB DİLLER İLE ELEKTRİK ELEKT.FAK.33 ADET VANA DEĞİŞİMİ)	28.750,00	5.175,00	33.925,00

51	EĞİTİM FAK.,FEN EDEB.FAK 3'er ADET. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAK. 8 ADET KONE ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMES (TOPLAM 14 ADET ASANSÖR) (6 aylık)	6.436,00	1.158,48	7.594,48
52	MERKEZ LAB. NA DOĞALGAZ KUTUSUNDAN TESİSAT ÇEKİLMESİ İŞİ	45.000,00	8.100,00	53.100,00
53	GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜNE 5 MP İÇ ORTAM SABİT KAMERA takılması işi	7.785,00	1.401,30	9.186,30
54	EĞİTİM FAK.,FEN EDEB.FAK 3'er ADET. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAK. 8 ADET KONE ASANSÖR BAKIMI TEMMUZ 2021	6.436,00	1.158,48	7.594,48
55	KONE ASANSÖR ELEKTRİK ELEKTRONİK FAK. 8 ADET KONE ASANSÖR BAKIMI EYLÜL VE EKİM 2021	6.800,00	1.224,00	8.024,00
56	kone asansör fen-edebyat ve eğitim fak. Eylül ve ekim ayları bakımı	6.072,00	1.092,96	7.164,96
57	KONE ASANSÖR EĞİTİM FAK. OCAK-ŞUBAT-MART-MAYIS-HAZİRAN AYI BAKIMI	6.800,00	1.224,00	8.024,00
58	KONE ASANSÖR Elektrik elek. FAK. OCAK-ŞUBAT-MART-MAYIS-HAZİRAN AYI BAKIMI	14.800,00	2.664,00	17.464,00
59	KONE ASANSÖR FEN-EDEBİYAT FAK.. OCAK-ŞUBAT-MART-MAYIS-HAZİRAN AYI BAKIMI	6.400,00	1.152,00	7.552,00
60	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ISITMA HATTI TAMİRİ	10.000,00	1.800,00	11.800,00
61	FEN EDEBİYAT -İNŞAAT VE BİLGİ İŞLEM ,elektrik-elektronik,kütüphane ve kongre merkezi CHİLLER SOĞUTMA GRUPLARI BAK.SÖZL.	50.000,00	9.000,00	59.000,00
62	İktisat fakültesi engelsiz üniversite başvurusu için eksikliklerin yapımı	12.750,00	2.295,00	15.045,00
63	BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ OFİS TADİLATI	51.500,00	9.270,00	60.770,00
64	beşiktaş kampüsü switch kabini taşınması internet, fiber kablolama,....	38.500,00	6.930,00	45.430,00
65	LOJMAN ÇATILARININ İSG AÇISINDAN KÜPEŞTE GÜÇLENDİRME İŞİ	38.000,00	6.840,00	44.840,00
66	Laboratuvar Çekercok Havalandırma Sisteminin Kurulması	105.000,00	18.900,00	123.900,00
67	yabancı diller klima tahliye hortumlarının değiştirilmesi	17.100,00	3.078,00	20.178,00
68	ÖĞRENCİ İŞLERİNE RAF SİSTEMİ YAPILMASI	50.000,00	9.000,00	59.000,00
69	BİLİM TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SU DEPOSU ARIZALARI	12.565,00	2.261,70	14.826,70
70	HALKALI FULYA SİTESİ B11 D37 NOLU DAİRENİN ISINMA BORULARININ YENİLENMESİ	3.000,00	540,00	3.540,00
71	YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İLE KİMYA MET.YER TİPİ FANCOİL YILLIK BAKIMLARI TEK SEFER	15.000,00	2.700,00	17.700,00
72	ELEKTRİK ELEKTRONİK FAK. ALÜMİNYUM DOĞRAMA CAM FİLMİ	2.650,00	477,00	3.127,00
73	SANAT TAS.FAK. SINIFIN 65 M2 MİNEFLO YAPILMASI	6.840,00	1.231,20	8.071,20
74	BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ MİMARLIK FAK. ATIK SU TADİLATI	9.170,00	1.650,60	10.820,60
75	REKTÖRLÜK YÖNLENDİRME TABELASI YAPIMI	12.000,00	2.160,00	14.160,00
76	İNŞAAT FAK. ASANSÖR KAPI KARTLARI DEĞİŞİMİ	1.600,00	288,00	1.888,00
77	elektrik elektronik fak. 1 adet masa için pleksiglas malzemeden siperlik yapımı	1.275,00	229,50	1.504,50
78	sanat ve tasarım fak. Bina girişindeki bariyer tamiri	1.861,25	335,03	2.196,28
79	İktisadi ve İdari Bilimler fak.Kapı isim tabelaları yapımı	1.920,00	345,60	2.265,60
80	İNŞAAT FAK. ÇEVRE MÜH. 18 M2 PARKE YAPIMI	2.200,00	396,00	2.596,00
81	B BLOK ASANSÖR KAPI KİLİDİ TAMİRİ	800,00	144,00	944,00
82	KÜTÜPHANE BİNASINDAKİ 2 ADET ASANSÖRE MAVİ ETİKET ALIMI	35.500,00	6.390,00	41.890,00
83	FEN EDEBİYAT FAK. ACİL TAHLİYE ÇIKIŞ KAPISI YAPIMI	2.600,00	468,00	3.068,00
84	ELEKTRİK ELEKTRONİK FAK. CAM FİLMİ YAPIMI	2.000,00	360,00	2.360,00
85	kütüphane asansör bakım sözleşmesi	1.619,49	291,51	1.911,00
86	BAKIM ONARIM MÜD. TARİHİ HAMAM ISITMA SİSTEMİ BAKIMININ YAPILMASI	1.250,00	225,00	1.475,00
87	UYGULAMALI BİLİMLER SERAMİK ALIMI VE KAPLAMA İŞİ	20.000,00	3.600,00	23.600,00
88	DEMİR ATÖLYESİNİN CAM FİLMİ VE PERDE YAPIMI	3.615,03	650,70	4.265,73
89	İNŞAAT FAK. KALORİFER KAZANI TAMİRİ	1.000,00	180,00	1.180,00
90	BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ BOYA VE ALÇIPAN İŞLERİ	2.000,00	360,00	2.360,00
91	MERKEZ LAB. B23A NOLULABORATUVARA İNTERNET HATTI ÇEKİLMESİ İŞİ	1.958,00	352,44	2.310,44
92	KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA BİRİMİ ÇATI TADİLATI	30.000,00	5.400,00	35.400,00
93	ELEKTRİK ELEKTRONİK FAK.C BLOK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ	6.000,00	1.080,00	7.080,00
94	inşaat fakültesi su tesisatı tamiri	19.500,00	3.510,00	23.010,00
95	kütüphane asansör arızası	800,00	144,00	944,00
96	MERKEZ DEPODAKİ PATLAK BORULARIN DEĞİŞİMİ	4.067,80	732,20	4.800,00
97	UYGULAMALI BİLİMLER FAK. TABELA SÖKÜLMESİ İŞİ	3.500,00	630,00	4.130,00

2.1.5. 2021H03-167998 Muhtelif İşler

Muhtelif İşler Projesine 2021 yılı başlangıç ödeneği **olarak 7.200.000 TL** tahsis edilmiş ve revize ödenek **15.620.000 TL**, harcama ise **15.610.089 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Başlangıç ödeneğinin **5.540.000 TL'si** İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı altında hazine yardımı, **1.660.000 TL'si** ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı altında öz gelir olarak bütçeleştirilmiştir.

Revizyon işlemleri sonrası hazine yardımı ödeneği **14.760.000 TL**, öz gelir ödeneği ise **860.000 TL** olarak gerçekleşmiştir. Hazine yardımı ödeneğinin **14.759.228,20 TL'si**, öz gelir ödeneğinin ise **850.860,58 TL'si** harcanmıştır.

- **Sorumlu Birim:** İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Network Yapısı Değişiklikleri ve Kampüs İçi kablosuz Ağ yapımı
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık İhale
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlandı.
- **Sorumlu Birim:** İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Öğrenme Yönetim Sistemi
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık İhale
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlandı.
- **Sorumlu Birim:** İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri:**
 - **Adı:** Network Yük Dengeleme Sanal Cihaz Lisans Alımı
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık İhale
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlandı.

- **Sorumlu Birim:** İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri:**
 - **Adı:** Öğrenci Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık İhale
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlandı.

- **Sorumlu Birim:** İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri:**
 - **Adı:** Microsoft Lisans Alımı
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık İhale
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlandı.

- **Sorumlu Birim:** Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Bilgi Veri Tabanı Sunucusu Alımı
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Doğrudan Temin
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlandı.
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında ihtiyaç duyulan veri tabanı sunucusu alınmıştır.

- **Sorumlu Birim:** Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Bilgisayar alımları
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Doğrudan Temin
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlandı.
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
Başkanlığımıza bağlı birimlerin bilgisayar eksikleri giderildi.

- **Sorumlu Birim:** Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Kamera Alımları
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Doğrudan Temin
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlandı
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**

Yemekhane birimindeki kamera eksikleri tamamlandı.

- **Sorumlu Birim:** Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Makine Alımları
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Doğrudan Temin
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlandı
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**

Yemekhane birimine acil gerekli olan bulaşık makinası, benmari, kuver ünitesi ve kule dolabı alındı.

- **Sorumlu Birim:** Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Masa Sandalye Alımları
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Doğrudan Temin
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlandı
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**

Yemekhane biriminin büyütülmesi nedeniyle yeni masa ve sandalyeler alındı.

- **Sorumlu Birim:** Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Makine Alımları
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Doğrudan Temin
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlandı
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
Havuz için temizleme robotu alındı.

- **Sorumlu Birim:** Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** Makine Alımları
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Doğrudan Temin
 - **Projede Geline Aşama:** Tamamlandı
 - **Proje Kapsamında Yapılan İşler:**
Yemekhane binası için turnikeler alındı.

2.1.6. 2021H03-167997 Yayın Alımı

Başlangıç ödeneği **4.000.000,00 TL** olup, revize ödenek **3.000.000 TL** ve nakdi gerçekleşmesi **2.960.831 TL** gerçekleşmiştir.

- **Sorumlu Birim:** Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 - **İhale Bilgileri:**
 - **Adı:** Yabancı Dil Kitap Alımı İhalesi
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık İhale Usulü
- 475 Kalem Yabancı Dilde Kitap Alımı

SIRA NO	KOLEKSİYON TÜRÜ (VERİ TABANI ADI, KİTAP/ DERGİ)	ÖDENEN TUTAR
1	BSOL	243.595,89 TL
2	AMS AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY	30.237,97 TL
3	Reaxys	338.179,88 TL
4	IOP	115.564,34 TL
5	Sage Premier Journals	139.265,56 TL
6	Sage Premier Journals	25.017,76 TL
7	SAE Technical Papers	109.355,28 TL
8	ASTM	113.504,05 TL
9	ASCE	92.722,52 TL
10	ACS	239.785,75 TL
11	EbscoHost Econlit With Fulltext, EbscoHost Education Source, EbscoHost Art Architecture SourceOnline Veri Tabanı, EBSCO INTERNATIONAL INC.	404.205,83 TL
12	ACM	74.410,33 TL
13	ASME (SETTING THE STANDARD) (SM)	81.626,64 TL
14	SOBIAD +%18 KDV	11.484,00 TL
15	TSE +% 18 KDV	10.800,00 TL
16	Proquest Materials Science and Engineering (11.004 USD+%18 KDV); (ProQuest Art, design and architecture collection) (7.727 USD +%18 KDV); E-Book Central (Ebrary) (9.959 USD+%18 KDV)	294.241,06 TL
17	Videoeğitim portalı (VideoLMS) +%18 KDV	24.160,50 TL
18	EDS Keşif Aracı (5.100 USD +% 18 KDV)	53.511,72 TL
19	VETIS +%18 KDV	33.040,00 TL
20	Informascope (Turccademy) +%18 KDV	47.360,31 TL
21	(OCLC ILL) (630 EUR +%18 KDV)	8.029,56 TL
22	Springer E-Kitap (465 adet)	128.830,74 TL
23	Türkçe Kitap Alımı (1.653 kalem) (Doğrudan Alım Usulü)	84.539,30 TL
24	Yabancı Dilde Kitap Alımı (475 kalem) (İhale usulü)	252.582,14 TL
25	Türkçe Dergi Basılı ödeme (2 taksitte Doğrudan Alım Usulü ödenmiştir.)	4.779,75 TL

Tablo 5: Yayın Alımı Projesi Kapsamında Gerçekleşen Alımlar

GERÇEKLEŞEN ALIMLAR	ADET
Abone Olunan Yabancı Dilde Dergi Sayısı (Online)	Yok
Abone Olunan Basılı Dergi Sayısı	16 başlık, 22 adet
Abone Olunan Yabancı Dilde Elektronik Veri tabanı Sayısı	40
Abone Olunan Türkçe Elektronik Veri tabanı Sayısı	5

2021 yılında aboneliği devam eden veri tabanı paketi sayımız 30+15 EKUAL olmak üzere 45'tir.

Kütüphanemiz elektronik kaynakları 3 ayrı platformda hizmet sunmaktadır:

- **E-Dergi Veritabanları:** 27 adet
- **E-Kitap Veritabanları:** 6 adet
- **E-Referans Veritabanları:** 12 adet

2.2. Eğitim - Kültür Sektörü

Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Programı, Eğitim-Kültür sektöründe toplam **3 adet proje** yer almaktadır. Bu projelere toplam **3.800.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Sektörün yılsonu revize ödeneği **2.711.000 TL** olarak gerçekleşmiş ve toplam **2.710.517 TL** harcama yapılmıştır.

2.2.1. 2019H04-86515 Tarihi Su Sarnıcının Restorasyonu

Projeye başlangıç ödeneği olarak **800.000 TL** tahsis edilmiş ve revizyon sonrası **441.548 TL** ödenek, harcama ise **441.557 TL** olarak gerçekleşmiştir.

- **Sorumlu Birim:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- **İhale Bilgileri**
 - **Adı:** YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi Su Deposu Restorasyonu Yapım İşi
 - **Mevzuat Dayanağı:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 - **Usulü:** Açık İhale
 - **Projede Geline Aşama:** Davutpaşa Kampüsü Tarihi Su deposu Restorasyon çalışmaları 2020 yılı içerisinde başlamış olup devam etmekte olup , 2021 yılı itibariyle bitirilmiştir.
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı:** % 100




2.3. DKH-Sosyal – Teknolojik Araştırma Sektörü

Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Programı, DKH-Sosyal – Teknolojik Araştırma sektöründe Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı Projesi yer almaktadır.

2.3.1. 2018K-17267 Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı

Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı Projesine 2021 yılı başlangıç ödeneği olarak **11.000.000 TL** tahsis edilmiş ve 2021 yılı için gerçekleşen harcama olmamıştır. 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan dipnotta “2021 Yılı Yatırım Programında 2018K-17267 proje numarasıyla yer alan Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı projesinin kalan ödeneği Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı projesinde kullanılacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

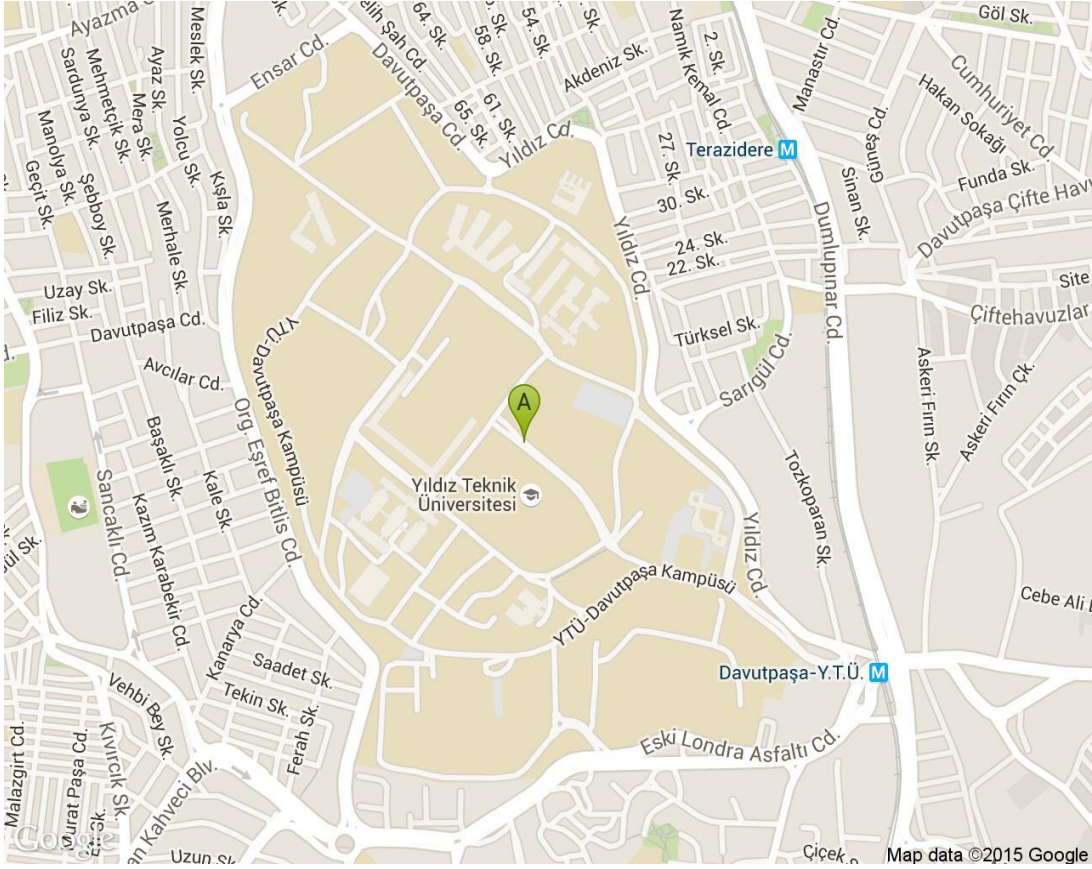

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



0212 383 22 70



0212 383 22 89



stg.yildiz.edu.tr



Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. 34220
Esenler - İSTANBUL

